

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 4 кв 2021



Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 4 кв 2021

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Место расположение объектов	План (стоимость работ)	Факт по оперативным данным	Отклонение	Примечание
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	переезд	2	1. 110 300 км, 197 200 км и 206 500 км МН Кенкияк-Кумколь в Актыубинской области.	9 932	0	-9 932	По итогам тендерных процедур заключен договор №619041/2021/1 от 16.09.2021 года с ТОО ""Саулет ТН"" согласно которому запланировано строительство 3 переездов. Работы завершены. На данный момент идет этап формирования документации к сдаче выполненных работ.
2	Разработка ПИР на модернизацию системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода на линейной части Кенкияк – Кумколь	ПИР	1	1. КУУН Кенкияк в Актыубинской области. 2. ОАВП Аральск в Кызылординской области. 3. КУУН Кумколь в Карагандинской области.	36 104	36 104	0	Заключен договор № 612677-2021-1 с ТОО Renaissance Capital.
3	Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	объект	3	1. КУУН Кенкияк в Актыубинской области. 2. ОАВП Аральск в Кызылординской области. 3. КУУН Кумколь в Карагандинской области.	280 400	280 400	0	По итогам тендерных процедур заключен договор №578988/2021/1 от 07.07.2021 года с ТОО "Seven Hills of Kazakhstan" на сумму 280 400 тыс. тенге.
4	Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	объект	1	Строительство административно-бытового комплекса	116 299	288 093	171 795	Исполнено
5	Закуп основных средств	объект	1	Приобретение аварийного запаса на объекты магистрального нефтепровода	28 295	28 295	0	
ИТОГО					471 030	632 892	161 862	1

01




02



03



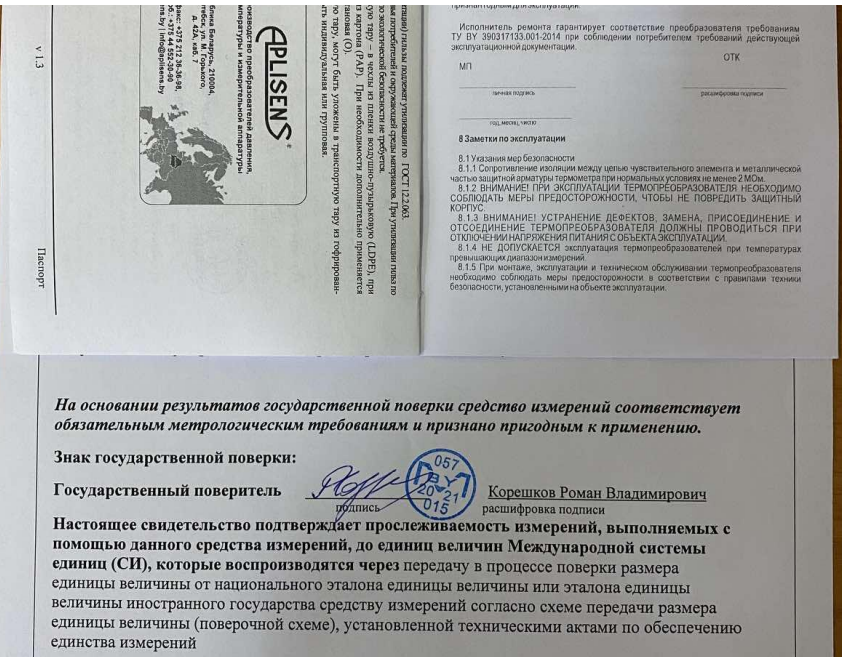

Закуп основных средств



05

